



DOŚWIADCZENIA KLUBU PRZYRODNIKÓW Z REALIZACJI PROJEKTÓW LIFE



Kilka słów wstępu...

- KLUB PRZYRODNIKÓW w partnerstwie różnymi podmiotami zrealizował dotychczas 5 projektów LIFE a 2 kolejne obecnie realizuje
- Obecnie realizowane są 2 międzynarodowe projekty ochrony torfowisk – wysokich z Niemcami i alkalicznych z Belgami.



Fot. Ewa Gutowska



Kilka słów wstępu...

Co do zasady skupiamy się na kompleksowej ochronie jednego typu siedliska – torfowisk wysokich, muraw, torfowisk alkalicznych

Takie podejście ułatwia stworzenie spójnej koncepcji ochrony ALE

jednocześnie wymaga włączenia w projekt sporej powierzchni by działania ochronne miały sens w skali kraju.



Kilka słów wstępu...

W projektach były planowane działania tj.

- ❖ Miękkie działania ochronne (koszenie, wypas, wycinka)
- ❖ Twarde działania ochronne (budowa i remont infrastruktury – kładki, zastawki etc. ale też większa infrastruktura)
- ❖ Wykupy gruntów
- ❖ Opracowanie dokumentacji przyrodniczych typu plan ochrony, plan zadań ochronnych, HAP
- ❖ Warsztaty, spotkania, szkolenia, konferencje



Doświadczenia Klubu

Planowanie projektu

PARTNERZY i współpraca

- ❖ niech będą sprawdzeni w czasie innych wspólnych działań
- ❖ lepiej mniej niż więcej
- ❖ umowa partnerska bywa trudna do uzgodnienia nawet przy dobrej współpracy
- ❖ współpraca przy pisaniu wniosku bardzo dobrym wskaźnikiem późniejszego zaangażowania



Doświadczenia Klubu

Planowanie projektu i pisanie wniosku

- ❖ Nie mówię o oczywistych sprawach...
- ❖ Najwięcej czasu zabierają rozmowy z potencjalnymi partnerami lub interesariuszami
- ❖ Im bardziej szczegółowy własny budżet tym łatwiej potem nanosić zmiany w czasie rewizji wniosku i odpowiadać na zadane pytania



Doświadczenia Klubu

Pisanie wniosku

- ❖ Z naboru na nabór coraz większa szczegółowość pytań na etapie rewizji
- ❖ Deklaracje poparcia przy wniosku pomagają w późniejszych rozmowach o realizacji
- ❖ I tak nie przewidzi się wszystkiego...



Doświadczenia Klubu

Realizacja projektu

- ❖ Jedna osoba do zarządzania i administracji to za mało zasobów
- ❖ Znajomość prawa jest nieodzowna – prawo budowlane, zamówień publicznych, kodeks cywilny, ustawa o lasach, o ochronie przyrody, prawo pracy, ustawa o rachunkowości...

To nie jest wiedza do „wygooglania”



Doświadczenia Klubu

Realizacja projektu

- ❖ Generalnie trzeba liczyć na siebie i własną znajomość prawa i wytycznych – na wsparcie Monitora i KE liczyć tylko w rzeczywiście grubych sprawach
- ❖ Czasami partnerstwo pomaga
- ❖ Czasami wymiana know-how pomaga
- ❖ Baza wiedzy o realizacji projektów coraz większa więc warto pytać i rozmawiać



Doświadczenia Klubu

Realizacja projektu

WSPÓŁPRACA Z PGL LP

- ❖ Trudna choć co do zasady pozytywna
- ❖ Nigdy za wiele rozmów, powtarzania rzeczy oczywistych, notatek, pism, maili...
- ❖ Warto jej poświęcić dużo uwagi, bo jest to czuły punkt Lasów...
- ❖ Nigdy nie omijać oficjalnej hierarchii w Lasach



Doświadczenia Klubu

Realizacja projektu

ROZLICZENIA

- ❖ Dla NGO problemem jest płynność finansowa pomiędzy zaliczkami i na koniec projektu. Tego nie można bagatelizować!
- ❖ Kilkuletnia przerwa w dofinansowaniu projektów przez NFOŚiGW = kilka źródeł współfinansowania = większy stopień skomplikowania rozliczeń




Doświadczenia Klubu

I kilka słów mądrości na koniec :)

- ❖ Czas biegnie szybko
- ❖ Dobre planowanie nigdy nie jest złe
- ❖ Prawo Murphy'ego obowiązuje wszędzie
- ❖ Zasada 80/20 też (zwłaszcza w odniesieniu do zasobów ludzkich...)



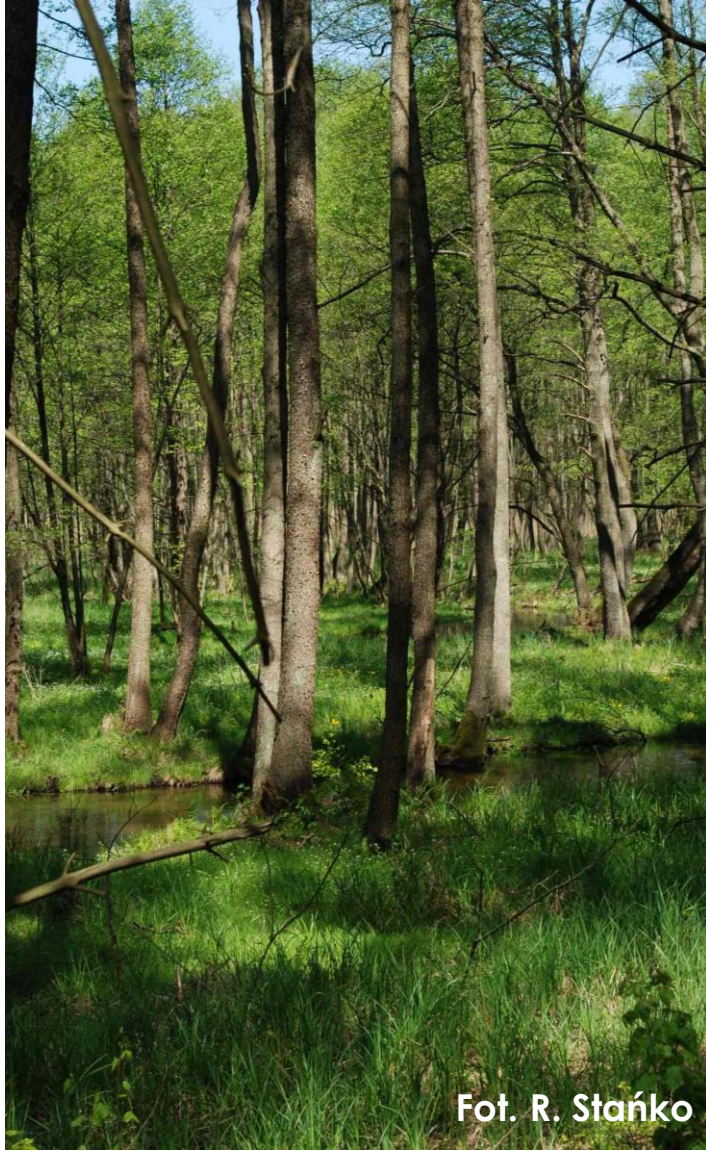

Fot. R. Stańko

Dziękuję za uwagę!

Magdalena Makowska

Klub Przyrodników

508 – 422 – 776

m.makowska.kp@gmail.com
